

東員町 橋梁長寿命化修繕計画

(橋梁個別施設計画)

公表資料

令和5年3月
(令和7年12月改定)

東員町 建設課

1. 長寿命化修繕計画の目的


1) 背景

- 東員町が管理する橋梁は、令和4年4月現在、全143橋（橋長2m以上）で、そのうち15m以上の橋梁は33橋、15m未満の橋梁は110橋である。
- 管理橋梁全143橋の内、建設年次の記録がない橋梁が1橋あり、建設年次が明確である142橋の内、現時点で建設後50年を経過した橋梁は31橋であるが、20年後には建設後50年を経過する橋梁が125橋と約88%を占め、橋梁の高齢化が進展していきます。
- これまでの橋梁の維持管理は、損傷が深刻な状態に陥った段階で、大規模な修繕や橋梁を架替えるなど、事後的に修繕を実施する対症療法型の手法がとられてきました。
- 今後、高齢化橋梁が急速に増加していくことから、従来同様の事後的な維持管理では維持管理に係る費用が膨大となり、利用者への安全性や信頼性を確保するための適切な維持管理の継続が困難となり、結果として道路サービスの低下に繋がることが予想されます。
- 平成26年度改定された道路法に法り全管理橋を5年毎に点検致します。


2) 目的

- 安全性や信頼性を確保した道路サービスの提供を目的に、長寿命化修繕計画を策定し、従来の事後的な維持管理から予防的な修繕および計画的な架替えを実施する、予防保全型へと管理手法の転換を図る。
- 長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の長寿命化並びに維持管理費用の縮減を図る。

【 2022年 】

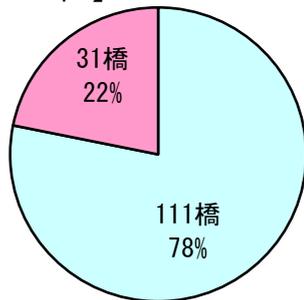


【 2042年 】

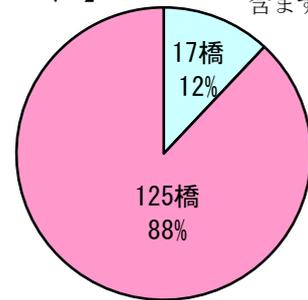

20年後

■ 建設後50年未満
■ 建設後50年以上

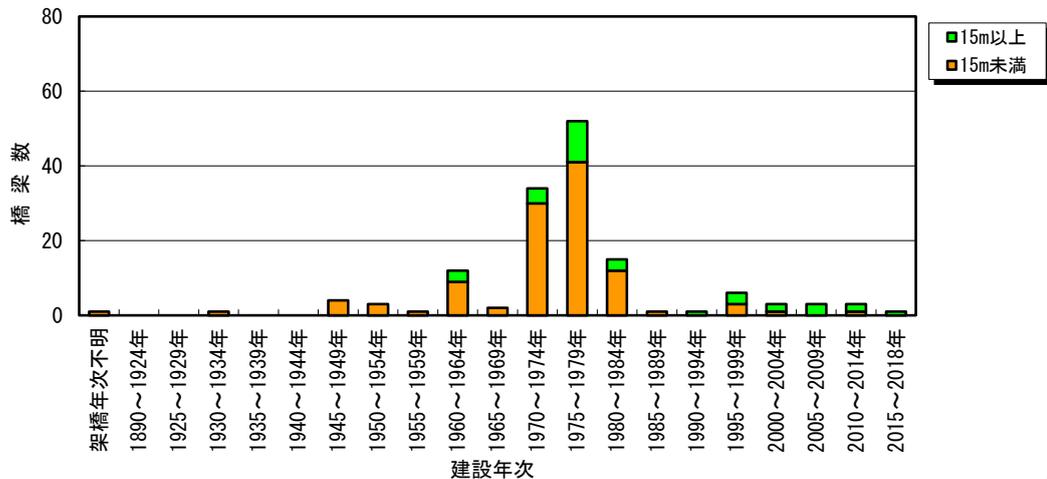

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

	橋 梁 数		
	15m以上	15m未満	合 計
全管理橋梁数	33	110	143
うち計画の対象橋梁数	33	110	143
うちこれまでの計画策定橋梁数	0	0	0
うち令和4年度計画策定橋梁数	33	110	143

○ 長寿命化修繕計画の対象：東員町が管理する全ての橋梁を対象とする。

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

1) 健全度の把握の基本的な方針

- 健全度の把握は、東員町橋梁点検要領（案）に基づく点検を定期的を実施し、橋梁の損傷状況を踏まえ継続的に健全度の把握を行っていきます。

2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

- 橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロール等の実施を徹底していきます。

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

1) 長寿命化修繕計画の基本方針

○ 予防保全型への転換

橋梁の損傷が深刻な状態に陥った段階で、大規模な修繕や架替えを実施する対症療法型の維持管理から、定期的に点検を実施して、損傷が深刻な状態に陥る前に修繕を実施する予防保全型へと維持管理手法の転換を図ることで、橋梁の寿命を延ばすことが可能となり、修繕および架替えに係る維持管理費用の縮減に努めていきます。

○ 対策の優先順位の考え方

事業の実施計画を策定するに当たり、対策の優先順位は、各橋梁の重要度、主要部材の健全性、架橋年次、橋梁規模から判断して総合的に評価します。

STEP. 1

主要4部材の健全度の最悪値と当該橋梁が属するグループから決まる優先順位



STEP. 2

主要4部材の健全度の最悪値と主要4部材の重要度から決まる優先順位



STEP. 3

架橋年次が新しい順



STEP. 4

橋長が長い順



技術者による総合的判断

▲優先順位の流れ

小
大

区分		評価基準
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

▲健全性の評価内容

主要4部材の健全度の最悪値	グループ				
	A	B	C	D	E
	高 重要度 低				
I	-	-	-	-	-
II	11	12	13	14	15
III	6	7	8	9	10
IV	1	2	3	4	5

小
大

▲STEP. 1 グループと健全性

主要4部材の健全度の最悪値	主要4部材			
	主桁	床版	下部工躯体	支承本体
	高 重要度 低			
I	-	-	-	-
II	8	9	10	11
III	4	5	6	7
IV	1	2	3	※1

小
大

▲STEP. 2 主要部材と健全性

※計画的に定期点検を実施して、最新の点検結果に基づき適宜見直しを行ってまいります。

2) 費用縮減や事業の効率化に向けた取り組み

○ 集約化・撤去等による費用縮減

社会経済情勢や施設の利用状況の変化、施設周辺の道路の整備状況に応じて、橋梁の集約化・撤去および機能縮小などによる費用縮減に取り組むこととし、令和9年度までに、管理する橋梁のうち1橋程度の集約化・撤去等の検討を行います。

また、集約化・撤去および機能縮小により橋梁の維持管理等に係る費用の内、約26万円/年のコスト縮減を目指します。

○ 新技術・新材料の活用

今後、定期点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減を図るために新技術等の活用について検討することとし、管理する橋梁における向こう5年間の修繕や点検等において、約1割の橋梁で新技術等の活用を目標とします。

○ 新技術の活用によるコスト縮減の目標

東員町では、試算に基づく新技術活用によるコスト縮減額（約520万円）に対し、令和9年度までの5年間で約1割程度のコスト縮減を目指します。

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

1) 次回定期点検時期

- 定期点検とは、予め一定の期間を定めて行うもので、東員町橋梁点検要領（案）に基づき、5年に1回の頻度で実施することを基本とします。

2) 修繕計画（計画期間）

- 今後50年間における補修対策を定めた「橋梁長寿命化修繕計画（令和4年3月）」に基づく、向こう10年間の対象橋梁における年度別の橋梁数と対策費は次の通りです。なお、本表に示す数値は修繕計画により想定したもので、事業実施に係る数値とは異なるため、適宜見直しを行っていきます。


	令和5年度 計画	令和6年度 計画	令和7年度 計画	令和8年度 計画	令和9年度 計画
修繕＋点検	3	3	3	146	3
修繕対策費（千円）	6,081[3]	6,748[3]	3,668[3]	10,936[3]	6,745[3]
橋梁点検・長寿命化対策費(千円)	-	-	-	28,600[143]	5,863[143]
合計（千円）	6,081	6,748	3,668	39,536	12,608


※ []内の値は、対象となる橋梁数（重複含む）である。

	令和10年度 計画	令和11年度 計画	令和12年度 計画	令和13年度 計画	令和14年度 計画
修繕＋点検	3	3	3	146	3
修繕対策費（千円）	4,938[3]	14,619[3]	6,064[3]	5,192[3]	3,634[3]
橋梁点検・長寿命化対策費(千円)	-	-	-	28,600[143]	5,863[143]
合計（千円）	4,938	14,619	6,064	33,792	9,497

※ []内の値は、対象となる橋梁数（重複含む）である。

【 修繕等対策費の部材別内訳比率 】

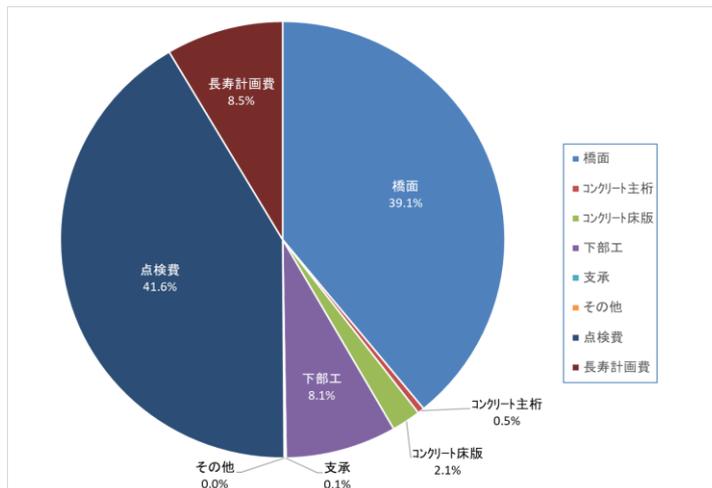

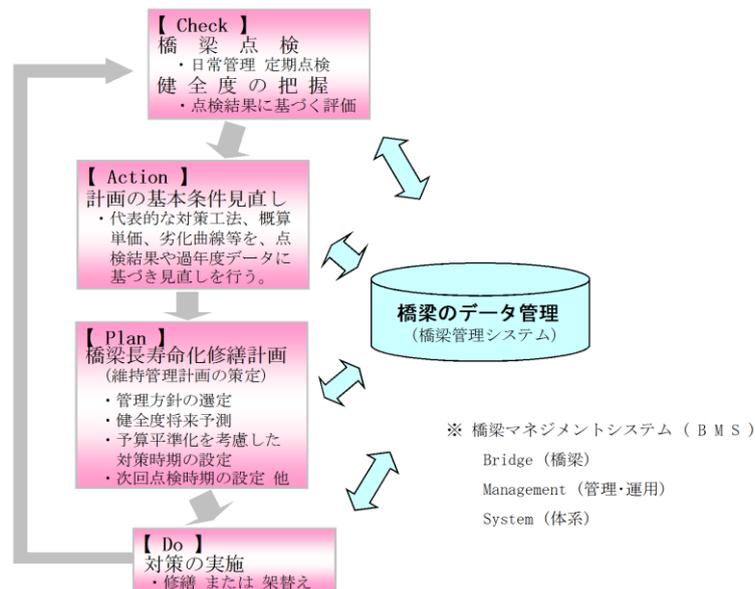


▲橋梁マネジメントシステムのフロー図

6. 長寿命化修繕計画による効果

1) 長寿命化修繕計画による効果

- 計画的に定期的な点検を実施することにより、橋梁の損傷が深刻化する前に早期に発見し修繕を実施することで、利用者への安全性と信頼性を確保した道路サービスが提供される。
- 長寿命化修繕計画により、予防的な維持管理を実施することで、橋梁の長寿命化やライフサイクルコストの縮減が図られる。
- 長寿命化修繕計画を策定する143橋について、予防保全的な修繕を実施して橋梁の寿命を延ばすことが可能となり、対症療法的に架替え（更新）を実施した場合との費用を比較した結果、今後50年間で約7.5億円のコスト縮減が見込まれます。

なお、コスト縮減額は、現時点での点検結果に基づき試算したもので、今後の財政状況や橋梁数の増減により、適宜見直しを行っていきます。

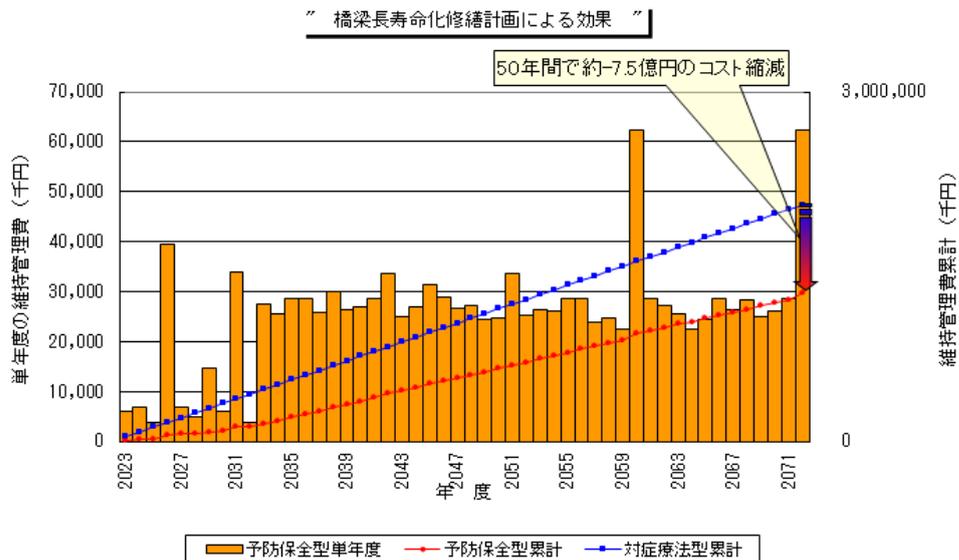

7. 老朽化の状況

1) 健全性の判定区分の割合

健全性	IV判定	III判定	II判定	I判定
橋梁数 (割合)	0橋 (0%)	3橋 (2%)	64橋 (45%)	76橋 (53%)

※2 巡目点検：令和3年度

2) 修繕措置等の着手状況

実施年度	IV判定	III判定	II判定
平成30年度	0橋	2橋	3橋
令和元年度	0橋	2橋	2橋
令和2年度	0橋	0橋	2橋
令和3年度	0橋	0橋	1橋
令和4年度	0橋	2橋	2橋

※令和5年3月時点

8. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門的知識を有する者

1) 計画策定担当部署

三重県 東員町 建設課 tel 0594-86-2809

2) 意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

東海国立大学機構 岐阜大学

情報連携推進本部

村上 茂之 教授

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径 間数	路線番号 路線名	管 理 区分 (橋名 最悪部)	年次 橋長 (m)	修 繕 計 画 (対策の内容・時期・概算費用)														
								年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
								概算費用計	6,081	6,748	3,668	39,536	6,745	4,938	14,619	6,064	33,792	3,634				
101	130	40038 3号橋	0	1	43751 町道南大社751 号線	D	架橋年次 1979	16.0	次回点検	対策内容 (代表的工法)	概算費用等	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
						主要4層打	I														点検年次 2021	
						部材全体	I														経過年数 43	
102	131	20016 殿下橋	0	1	23394 町道山田394号 線	D	架橋年次 1979	10.4	次回点検	対策内容 (代表的工法)	概算費用等	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
						主要4層打	I														点検年次 2021	
						部材全体	I														経過年数 43	
103	134	3008 藤川2号橋	0	1	33667 町道瀬古泉667 号線	D	架橋年次 1975	25.9	次回点検	対策内容 (代表的工法)	概算費用等	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
						主要4層打	I														点検年次 2021	
						部材全体	I														経過年数 47	
104	142	20026 西住運橋	0	1	23444 町道穴太444号 線	D	架橋年次 1958	5.0	次回点検	対策内容 (代表的工法)	概算費用等	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
						主要4層打	I														点検年次 2021	
						部材全体	I														経過年数 64	
105	143	3011 東川原橋(歩 道橋)	2	2	33687 町道筑紫687号 線	E	架橋年次 1999	29.4	次回点検	対策内容 (代表的工法)	概算費用等	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
						主要4層打	I															点検年次 2021
						部材全体	II															経過年数 23
106	70	20009 土穴橋	0	1	23360 町道大木360号 線	A	架橋年次 1979	5.3	次回点検	対策内容 (代表的工法)	概算費用等	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
						主要4層打	I															点検年次 2021
						部材全体	I															経過年数 43
107	71	30022 上樋ノ虎橋	0	1	33535 町道大木535号 線	A	架橋年次 1979	5.0	次回点検	対策内容 (代表的工法)	概算費用等	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
						主要4層打	I															点検年次 2021
						部材全体	I															経過年数 43
108	74	30019 天ノ前1号橋	0	1	33526 町道大木526号 線	A	架橋年次 1979	2.0	次回点検	対策内容 (代表的工法)	概算費用等	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
						主要4層打	I															点検年次 2021
						部材全体	I															経過年数 43
109	100	40015 東条橋	0	1	43777 町道南大社777 号線	B	架橋年次 1979	4.9	次回点検	対策内容 (代表的工法)	概算費用等	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
						主要4層打	I															点検年次 2021
						部材全体	I															経過年数 43
110	103	30039 キトヲ南橋	0	1	33619 町道穴太619号 線	B	架橋年次 1974	4.0	次回点検	対策内容 (代表的工法)	概算費用等	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
						主要4層打	I															点検年次 2021
						部材全体	I															経過年数 48

橋梁長寿命化修繕計画一覧表 (10ヶ年)

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	管理 区分 別定区分 (橋架架 架架架)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 (対策の内容・時期・概算費用)																			
									年次	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032									
									概算費用計	6,081	6,748	3,668	39,536	6,745	4,938	14,619	6,064	33,792	3,634									
141	36	30047 南溝1号橋	0	1	33678 町道瀬古泉678 号線	C 架橋年次 1950 主要4部材	3.4	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								III 点検年次 2021 部材全体																				
								III 経過年数 72					200													200		
142	3	10001 笹尾1号橋	0	1	13150 町道笹尾西1丁 目歩道150号線	E 架橋年次 1977 主要4部材	12.6	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								III 点検年次 2021 部材全体																				
								III 経過年数 45					200													200		
143	2	30045 屋敷田2号橋	0	1	33635 町道筑紫635号 線	D 架橋年次 1974 主要4部材	14.5	次回点検																				
								対策内容 (代表的工法)																				
								III 点検年次 2021 部材全体																				
								III 経過年数 48					200													200		
